



2020 YILI YATIRIM İZLEME

ve

DEĐERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŐTİRME DAİRE BAŐKANLIĐI

Mart-2021

tau.edu.tr

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	1
1. GENEL BİLGİLER	2
1.1 MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
1.2. AMAÇ VE HEDEFLER	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
2.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
2.2. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	5
2.2.1 Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar	5
2.2.2 2020 yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	8
2.2.3 İnşaatı Devam eden-Tamamlanan Projeler	8
3. 2020 YILI YATIRIM VE PROJE UYGULAMALARI	14
3.1 Genel Yatırım Uygulamaların Durumu.....	15
3.1.1 Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi	15
3.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler	15
3.1.3 Kampüs Alt Yapısı	15
3.1.4 Muhtelif İşler	16
3.1.5 Yayın Alımı	16
3.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma).....	16
3.2 Proje Tamamlanma Raporu	16
3.3 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	20
2020 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablo	22

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek" misyonu ile 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan 5979 sayılı kanunla kurulmuştur.

Türk-Alman Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Rektörlüğe bağlı olarak; beş fakülte, bir yüksekokul, iki enstitü ve beş araştırma merkezi bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri imkânı sunmayı amaç edinen üniversitemiz bu doğrultuda fiziki alt

yapı yatırımlarını tamamlayıp, 2021-2025 yılı Stratejik Plan'da belirtilen diğer yatırım projelerini tamamlanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu bağlamda 2020 yılı yatırımları için üniversitemize, Merkezi Yönetim Bütçesinde uygun görülen 73.157.000,00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutara; Öz gelirimizden 135.450,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, likit karşılığı olarak da 12.770.901,00- TL ödenek eklenmiştir. Personel giderlerini karşılama ödeneği 6.555.000,00-TL' dir. Toplam revize ödeneğimiz 92.618.351,00- TL olmuştur.2020 yılı toplam revize ödeneğe göre gerçekleşme oranı ise toplamda % 84,6 olarak gerçekleşmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci 60'ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlama aşamasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür eder , ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Halil AKKANAT

REKTÖR

1. GENEL BİLGİLER

1.1 MİSYON, VİZYON, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kuruluşun Görevi (Misyon)

Yükseköğretim ve akademik araştırmalar alanında, Almanya yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yaparak yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sunmak, Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik iş birliğini geliştirmektir.

Kuruluşun Hedefi (Vizyon)

Bünyesine kazandıracığı nitelikli Türk-Alman öğretim elemanları ile ideal bir yükseköğretim merkezi, Türk-Alman sanayi/iktisat kuruluşları ve işletmeleri için yüksek düzeyde teknolojik, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasanın 130. maddesinde; yükseköğretim kurumları, çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır.

Yükseköğretimde amaç ve ilkeleri belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları düzenleyen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda üniversitelerin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş bulunmaktadır.

- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

- Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılana katılmak, bununla ilgili kurumlara iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

1.2. AMAÇ VE HEDEFLER

• Amaçlar

- A1.** Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim,
- A2.** Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak,
- A3.** Endüstri ile üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak,
- A4.** Teknolojik ve fiziki altyapısı göze çarpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak,
- A5.** Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

• Hedefler

Amaç 1: Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim

H1.1. Üniversite çapında uygulanabilen tüm programlarda çift diploma uygulamaları geliştirmek

H1.2. Erasmus hareketliliğini artırmak

H1.3. Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliğini artırmak

H1.4. Eğitim-öğretimin akademik altyapısının iyileştirilmesi

Amaç 2: Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak

H2.1. Bilimsel yayınlar aracılığıyla alan yazınına katkıda bulunmak

H2.2. Bilimsel konferans faaliyetlerini artırmak

H2.3. Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek

H2.4. Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı ve elektronik yayınların sayısının artırılması

H2.5. Bilimsel proje faaliyetlerini geliştirmek ve araştırma olanaklarının artırılması

Amaç 3: Endüstri-üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak

H3.1. Üniversite-Sanayi-Öğrenci iş birliğini artırmak

H3.2. Teknokentin Kurulması ve Faaliyetlerinin Artırılması

Amaç 4: Teknolojik ve fiziki altyapısı göze çarpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak

H4.1. Modern bir kampüste eğitim alınacak binalar, yeterli konfor ve donanıma sahip öğrenci yurt binaları ve engelli bireylerin kampüs içerisinde herhangi bir zorluk yaşamadan her noktaya erişim sağlayabilmesi

H4.2. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal kaynakları kullanılarak çevre dostu bir yerleşke haline getirilmesi ile su ve enerji giderlerinin azaltılması

H4.3. Atık yönetiminin iyileştirilmesi

H4.4. Spor alanlarının yapılması (Mini futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu vb.)

Amaç 5: Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması

H5.1. Üniversite öz gelirlerinin artırılması

H5.2. Döner sermaye ve Sürekli Eğitim Merkezi (ve diğer Merkezlerin) gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz yatırımlarının tamamı merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçedir. Özel bütçede gelir türleri bakımından öz gelir ve hazine yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır. 2020 yılı için üniversitemiz yatırım ödeneklerinin tamamı hazine yardımlarından oluşmakta olup, üniversitemizin başlangıç ödeneklerine göre 2020 Mali Yılı Yatırım Programı Projelerinin Finansman Kaynakları Tablo 1' yer almaktadır.

Tablo 1: 2020 Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları Tablosu

SEKTÖR	PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI			
			Özel Bütçe		LİKİT	TOPLAM
			Hazine Yardımı	Öz Gelir		
YÜKSEKÖĞRETİM	2014H03-2025	Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi	200.000,00	-	-	200.000,00
	2011H03-1420	Derslikler ve Merkezi Birim	29.200.000,00	-	4.300.000,00	33.500.000,00
	2020H03-152744	Kampüs Alt Yapısı	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00
	2020H03-151060	Muhtelif İşler	6.200.000,00	-	2.400.000,00	8.600.000,00
	2020H03-151047	Yayın Alımı	1.000.000,00	-	200.000,00	1.200.000,00
DKH	2017K12-3941	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000,00	-	-	10.000,00
GENEL TOPLAM			38.710.000,00		6.900.000,00	45.610.000,00

2.2. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2.2.1 Taşınmaz Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemiz beş fakülte, bir yüksekokul, iki enstitü ve beş araştırma merkezi ile hizmet vermekte olup, mülkiyet durumuna göre toplam 120.000 metrekare alana sahip olup 102.513 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgiyi çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.

Üniversitemizin mülkiyet durumuna göre ayrıntılı dağılımı Tablo 2 'de yer almaktadır.

Tablo 2 : Taşınmazların Kapalı Alan ve Mülkiyet Durumuna göre Dağılım Tablosu

	Mevcut Yerleşkede	Kapalı Alan (m2)	Yerleşke Alanı(m ²)	Mülkiyet Durumu	Açıklama
Kampüs Alanı	Rektörlük Hizmet Binası	8.680	120.000	Maliye Hazinesi	Beykoz I 353 ada ve 1 nolu parsel
	Fen Fakültesi	33.297			
	Hukuk Fakültesi				
	İ.İ.B.F.				
	K.S.B.F				
	Mühendislik Fak. Enstitüler				
	Yüksek Okul				
	Derslikler A-B Blok				
	Laboratuvar Binası (Prefabrik)	147,50			
	Laboratuvar Binası	13.851			
	Spor Alanları (Açık Sahalar)	1.658			
	Ana okul ve Okul Binası (Prefabrik)	4.107			
	Misafirhane	3.051			
	Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Binası	1.437			
Genel Bilgisayar Mekânları	4.135				
Kütüphane ve Yemekhane	5.988				
Diğer Alanlar (Bilgi İşl. Mer., Trafo, Telefon Dağ. Mer., Güvenlik Kulübesi, Depolar)	127				
TOPLAM	95.976,50				

Türk-Alman Üniversitesi'nin eğitim, sosyal, hizmet ve diğer alanlarının dağılım ve kapasitesi aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 : Eğitim Alanlarının Dağılımı

EĞİTİM ALANLARI							
EĞİTİM ALANLARI	KAPASİTE (KİŞİ)						Toplam
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251- üzeri	
Amfi							
Derslik	73	56		12		2	143
Bilgisayar Laboratuvarı	5	3	1				9
Genel Toplam	78	59	1	12		2	152

Tablo 4 : Sosyal Alanlarının Dağılımı

SOSYAL ALANLAR (m²)	
SOSYAL ALANLAR	2020
Yemekhane	1.240,58
Akademik Personel Dinlenme Odası	745,00
Kantin	971,13
Öğrenci Kulüp Odaları	405,16
Cep Sineması	85,00
Misafirhane	1.406,00
Öğrenci Yurdu	-
Açık Spor Alanları	1.658,00
Kapalı Spor Salonu	-
Toplantı Salonları	1.131,00
Konferans Salonları	1.241,00
TOPLAM	8.882,87

Tablo 5 : Hizmet ve Diğer Alanlar Dağılımı

HİZMET ve DİĞER ALANLAR		
	2020	
HİZMET ALANI	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Akademik Personel Çalışma Odası	337	7.615,00
İdari Personel Çalışma Odası	154	4.534,00
Depo	76	1.682,00
Arşiv	37	1.599,00
Atölye	4	88,00
Diğer Laboratuvarlar	60	7.476,00
Kütüphane	2	2.828,00
TOPLAM	670	25.822,00

2.2.2 2020 yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2020 yılında 6 adet proje yatırım programına dahil edilmiş olup, devam eden 2 adet proje mevcuttur. Ayrıca 4 adet projenin yapım işi tamamlanmıştır.

2.2.3 İnşaatı Devam eden-Tamamlanan Projeler

Proje No	Proje Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihi	Tamamlanma Oranı
2014H03-2025	Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi	Etüt-Proje	2014-2021	51,42
2011H03-1420	Derslikler ve Merkezi Birim	TOKİ 1.Etap (65.146 m ²)	2011-2021	83,26
		Öğrenci Yurdu (9.700 m ²)	2018-2022	-
2020H03-151047	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı m	2020-2020	%100
2020H03-151060	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri,Kesin Hesap, Makina-Teçhizat	2020-2020	%100
2020H03-152744	Kampüs Alt Yapısı	Doğal Gaz Dönüşümü, Elkt Hattı, Kamp. İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İsale, Tel. Hattı	2020-2020	%23,60
2017K12-3941	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	Teknolojik Araştırma, Makine-Teçhizat	2017-2020	%100

2.2.3.1 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

Üniversitemize ön tahsisi yapılmış olan 431 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli işlemleri dosyası hazırlatılarak ilgili kurumlara teslim edilmiş, incelemenin tamamlanmasının koruma amaçlı uygulama imar planı askı süreçleri tamamlanmasının ardından söz konusu parsel için Beykoz Lihkab tan aplikasyon krokisi hazırlanmıştır. Plan gereği yola ve yeşil alana terk ardından inşaat ruhsat sürecine başlanılacaktır. Bu süre zarfında Başkanlık olarak yaklaşık 9.700 m2 kapalı alana ve 165 öğrenciye barınma imkânı sağlayacak olan 1. Etap A Blok yurt binasının ihale işlemleri tamamlanmıştır.



Üniversitemiz kampüsünde bulunan ve TOKİ ile protokolü yapılan kampüs binalarımızın tamamlanmasında sona yaklaşılırken tüm kampüs alanımız için otomatik bahçe sulama sistemi için proje çalışmaları 2020 yaz döneminde bütçe imkânlarınca uygulamaya geçmek üzere hazırlanmıştır.

2.2.3.2 Derslikler ve Merkezi Birimler

21.11.2013 tarihinde TOKİ ile protokolü imzalanan I. Etap kampüs binaları inşaatları tamamlanmış olup; Üniversitemiz tarafından 2020 yılı Aralık ayı itibariyle teslim alınmaya başlanmıştır.



2.2.3.3 Kampüs Altyapısı

Üniversitemizin ilk binaları olan Prefabrik binalarımızın temel drenajlarının zaman içinde tıkanıdığı tespit edilmiş ve drenaj hattı yenilenmiştir.

Üniversitemiz kampüsünde artan araç ve yaya trafiğini düzenleyerek güvenli bir trafik akışı oluşturmak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla kampüs içi yollara trafik levha ve işaretçileri yerleştirilmiştir.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin başlatmış olduğu “Dumansız Kampüs” hareketine katkıda bulunmak için kullanımda olan bina önlerinde sigara içilmeyen alanlar oluşturulmuştur.

2020 yılı başlarında hayatımıza giren COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan uzaktan eğitimler için Fakülteler Binamızda bulunan 1 adet derslik Uzaktan Eğitim Stüdyosuna dönüştürülmüştür.

Kampüsümüzde bulunan ve sayıları gün geçtikçe artan patili dostlarımız için bakım ve besleme alanı oluşturulmuştur.

Üniversitemiz kampüsünde bulunan 109 adet Londra Çınarının tarihi mirasımızın gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından 06.03.2020 tarih ve 02-1360 sayılı kararda belirtilen bakımlar Başkanlığımız kontrolünde yapılmıştır.

Kampüs binalarının tamamlanması ile Üniversite merkezi kamera kayıt ve izleme sistem odası kurulmuştur.


2.2.3.4 Muhtelif İşler

Fakülteler binası ve Yabancı Diller Yüksek Okul binasında boya- badana tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yabancı Diller Yüksek Okul binası galvaniz çelik boru ana su hatlarının kompozit esaslı PPRC boru ile değiştirilmiştir.

Yabancı Diller Yüksek Okul binasında çalışmayan kazanlar ve patlamış olan boylarların değişimi gerçekleştirilmiştir.

"Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" kapsamında oluşturulan Sıfır Atık Projesi, 15.04.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında; 12 ton kağıt, 5 ton plastik, 1 ton cam ve 0,207 ton metal ayrıştırılarak; 200,634 adet ağaç-13.955,408 lt petrol-0,8748 ton ham madde geri dönüştürülmüş , ve 1.447,659 m3 sera gaz salınımı-330,456 m3 su tasarrufu-44,6154 m3 depolama alanı-79.448,386 kWh enerji tasarrufu yapıldı.

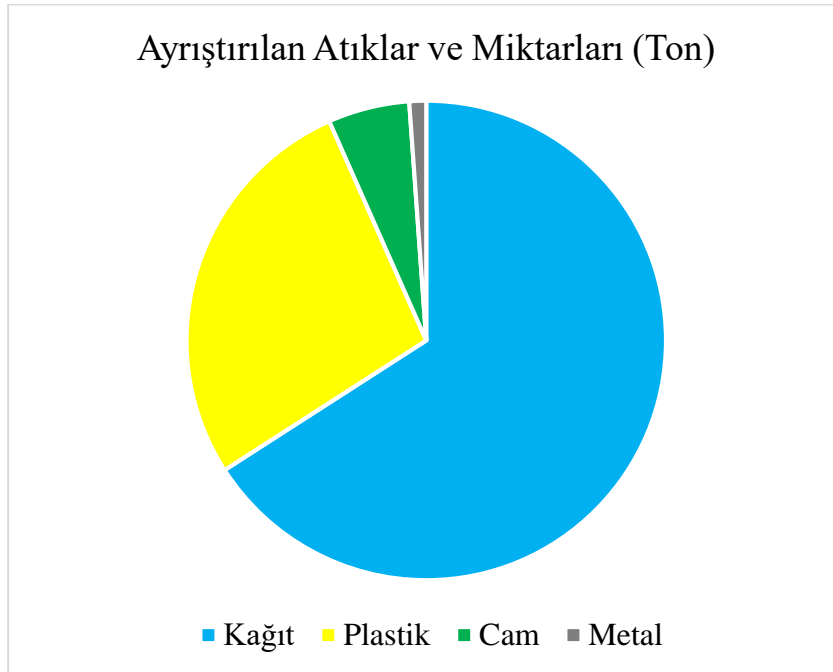

2020 yılı içerisinde Başkanlığımız bünyesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca 1 hizmet alımı, 21 (f) maddesi uyarınca 1 mal alımı olmak üzere 2 adet ihale ilan edilmiş ve sonuçlandırılarak sözleşmeye bağlanmıştır.

S. NO	KİK NO	İŞİN ADI	İHALE BEDELİ	YÜKLENİCİ
1	2020/46304	Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünün Resmi Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 01.04.2020-31.12.2022 (33 ay) tarihleri arasında Sürücüsüz 5 Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi.	Çalıkıran Tur. Taş. Oto. San ve Tic. A.Ş.	503.118,00.-TL.
2	2020/598026	Türk-Alman Üniversitesi 120 adet ranza satın alınması işi.	KONSEPT OFİS Mobilya Danışmanlık Elektronik İnşaat Nakliye San.ve Tic.Ltd.Şti	310.200,00 TL

2.2.3.4.1 Bakım-Onarım

2020 yılı içerisinde müdürlük olarak aşağıdaki iş ve işlemler mevcut personelimiz ve yüklenici firmalar marifeti ile yerine getirilmiştir.

Üniversitemiz idari ve akademik binalarında kullanımdan kaynaklı oluşan musluk, klozet, sifon vb. arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir.

Üniversitemiz Telefon sisteminde sistem ve kullanıcı kaynaklı arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmiş olup birimlerinin ihtiyaç duyduğu telefon makinesi ve telefon hattı ile ilgili talepleri yerine getirilip kullanımları sağlanmıştır.

Rektörlük ve İdari Birimler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Fakülteler binalarında taşınma, yer değiştirme ve yeni oluşturulan birim ve mekânlardan kaynaklı ihtiyaç duyulan telefon hattı, telefon makinası, grup priz, uzatma kablo ve benzer ihtiyaçları karşılanmıştır.

Üniversitemizde kullanılan tüm elektrik elektronik (UPS, Jeneratör, Telefon santrali, Trafo, Asansör) ve mekanik tesisat cihazların (Isıtma tesisatı, Soğutma tesisatı, Yangın ve kullanım suyu hidroforu, Havalandırma tesisatı) bakımları ilgili bakım iş ve işlemler anlaşmalı yüklenici firmalar marifeti ile müdürlüğümüz bünyesindeki teknik ekiplerimiz denetiminde periyodik olarak yaptırılmıştır.

İklimlendirme sistemlerinin mevsim koşullarına göre (ısıtma, soğutma) kullanıcıların maksimum konfor sağlayabilecekleri şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmiş oluşan arıza ve aksaklıklara ivedilikle müdahale edilmeye çalışılmıştır.

Binalarımızda kullanılan mekanik ve elektriksel sistemlerde oluşan arızalara gerek teknik ekiplerimizce, gerekse ilgili yüklenicilerle gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmıştır.

Üniversitemizin idari ve akademik birimlerince talep edilen her türlü masa, dolap, tablo vb. ürünlerin montaj-de montaj iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İdari ve akademik birimlerce talep edilen her türlü grup priz, uzatma kablosu, telefon makinesi benzeri ihtiyaçlar depo imkânlarımız doğrultusunda yerine getirilmiştir.

Binalarımızda kullanımdan kaynaklı oluşan kapı ve pencere arızalarına yerinde bakım ve tamiratları yapılmış gerek görülen alanlarda yüklenici firma marifeti ile tamir ve yenileme yoluna gidilmiştir.

Yıl içerisinde taşınma ve yerleşme işlemleri devam eden binalardaki ortak alanlara gerek görülen ürünlerin (WC'lere askı, sensörlü kağıt havlu ve içten çekmeli tuvalet kağıdı gibi.) montajları yapılmıştır.

Tüm binaların asansör arızalarına zamanında müdahale edilmiş ve gerekli durumlarda teknik servis desteği ile arıza ve periyodik bakımları yaptırılıp çalışır durumda olması sağlanmıştır.

Asansörlerin yıllık periyodik muayene iş ve işlemleri yerine getirtilmiş güvenli ve konforlu kullanımlar için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Tüm binalarımızın yangın alarm sisteminde (dedektör, gaz sensörü, alarm butonu gibi) verilen hata kodlarının yerinde bakılarak müdahalesi yapılmış ve alarm sistemine bağlı hatalar düzeltilmiş, ileri düzeyde teknik müdahale gerektiren kısımlar için teknik destek alınarak çözümlenmeler sağlanmıştır.

Üniversitemiz aktif binaları ve kullanım alanlarından daha verimli ve maksimum fayda sağlayacak şekilde yararlanılabilmesi için gerekli tüm tedbirler ve destekler mevcut personel ve ekipman dahilinde alınmaya çalışılmıştır.

Çevre aydınlatma grubunda arızalı direkler tespit edilip arızaları giderilmiştir.

Ambulant Laboratuvarına yeni alınan cihazların gerekli elektrik ve mekanik bağlantıları talep edilen su tesisatları yapılmıştır.

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Mühendislik Fakültesi ve Genel Bilgisayar laboratuvar binalarına gerekli telefon alt yapıları kurulmuştur ve testleri yapılmıştır.

Toki binalarındaki iş teslim süreçlerine katkı vermek amacıyla tüm şantiye sahasındaki çalışmalara iştirak edilip, eksiklerin tespiti ve takibi yapıldı.

Pandemi süreci kapsamında kampüsümüzde kullanım halindeki tüm binaların belirlenen kısımlarına dezenfektan aparatları ve ilgili talimatların montajı personelimiz tarafından yapıldı.

Geri dönüşüm Projesi kapsamında uygulamaya konulan yeni çöp kovaları ve ilgili talimatları içeren uyarı levhaları bütün binalarda belirlenen yerlere personelimiz tarafından montajı yapıldı.

Rektörlük, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Fakülteler binalarındaki cam fitillerinin tamamı kontrol edilip sorunlu olanlara silikonlama işlemi yapıldı.

Kampüs alanındaki bahçe sulama hattının bağlantı noktalarını standart hale getirmek için tamamında gerekli musluk ve vana değişimleri personelimiz tarafından yapıldı.

Rektörlük binası araç yıkama alanında ihtiyaç duyulan su deposu imalatı ve montajı personelimiz tarafından yapıldı.

Üniversitemiz muhtelif birimlerinin talepleri doğrultusunda ekip, ekipman ve malzeme desteği sağlanarak iş süreçlerine destek sağlanmıştır.

Üniversitemize Bakım Onarım kapsamında yapılan sözleşmelerle hizmet veren tüm yüklenicilerin rutin bakım onarım iş ve işlemlerini zamanında ve teknik şartnameler kapsamında yapmaları sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız doğrudan temin hizmet alımları ile ilgili harcama ve ödeme işlemleri bütçe, ilgili kanun ve mevzuatlar dâhilinde tamamlanmıştır.

Birimimiz demirbaş ve tüketim ambarlarındaki tüm ekipmanların kullanımları tüketimleri vb. işleri ile ilgili devir teslim taşınır evrak iş ve işlemleri usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

2.2.3.5 Yayın Alımı

Yayın alımları kapsamında 2020 yılı içerisinde 406 adet yabancı dilde (Almanca - İngilizce) ,1.630 adet Türkçe olmak üzere toplam 2.036 adet Basılı Yayın Alımı gerçekleştirilmiş ve kütüphane koleksiyonu 36.359 sayısına ulaşmıştır. Yine 2020 yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından erişim sağlanan elektronik kaynakların yanı sıra 8 Ulusal, 10 Uluslararası toplam 18 Elektronik yayın alımı gerçekleştirilerek kütüphanenin 63 elektronik kaynakla hizmet vermesi sağlanmıştır.

2.2.3.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Üniversitemizdeki Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Projesi Kapsamında alınan Yüksek Kapasiteli Depolama Sisteminin aktif hale getirilmesi için gerekli olan malzemelerin satın alınma işi,

Üniversitemizdeki Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Projesi Kapsamında Yüksek Kapasiteli Depolama Sistemi satın alım işi,

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Projesi Kapsamında alınan Türk Sanayinin Talaşlı İmalat İle İlgili Teknik Sorunlarını Bilimsel Araştırmalar ile Çözmek Üzere Bir Tesisin Kurulması için gerekli olan malzemelerin satın alınma işi,

Üniversitemiz Yüksek Teknolojik Malzemeler Üretim ve Karakterizasyon Laboratuvarı Kurulması için cihaz satın alınması işi,

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Projesi Kapsamında alınan Türk Sanayinin Talaşlı İmalat İle İlgili Teknik Sorunlarını Bilimsel Araştırmalar ile Çözmek Üzere Bir Tesisin Kurulması için gerekli olan cihazların satın alınması işi,

Üniversitemiz Laboratuvarına alınan Yüksek Başarılı Hesaplama ve Veri Saklama Merkezine Gaussian Yazılımı Kurulması için hizmet satın alınması işi,

Üniversitemiz Laboratuvarına alınan TGA cihazının arızasının giderilmesi için hizmet satın alınma işi,

Üniversitemiz laboratuvarına Taramalı Elektron Mikroskobu satın alınması işi,

Üniversitemiz Merkez Laboratuvarına 3 adet mikroskop satın alınması işi,

Üniversitemiz Merkez Laboratuvarına Otomasyon Sistemi Kurulumu için hizmet satın alınması işi,

Üniversitemiz Merkezi Laboratuvarına CNC Dik İşleme Merkezi Cihazı Satın Alınması işi,

Üniversitemiz Merkezi Laboratuvarına CNC Dik İşleme Merkezi Cihazı Satın Alınması işi, gerçekleştirilmiştir.

3. 2020 YILI YATIRIM VE PROJE UYGULAMALARI

3.1 GENEL YATIRIM UYGULAMALARIN DURUMU

2020 Yılı Yatırım Programında, Üniversitemiz için 38.710.000.00 ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde yapılan eklemeye ise 6.900.000.00-TL dir. Tahsis edilen ödenek toplamı 45.610.000,00-TL olmuştur. Tahsis edilen ödenekten 26.451.325.50 TL harcama yapılmıştır. Harcamalardan kalan 19.158.674,50-TL tutarın yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 58 dir.

Devam eden ve Tamamlanan Projeler

3.1.1 Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi

Çeşitli İşlerin Etüdü Projesi Kapsamında 2020 yılı bütçesinden 200.000,00.TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten 102.856,97 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 51,43 dir.

3.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler

- TOKİ 1.Etap projemiz için, 2020 yılı bütçesinden 19.500.000.00- TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten 19.324.393,01-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 99,09 dur.
- “Öğrenci Yurdu” projesi kapsamında, 2020 yılı bütçesinden 9.700,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten harcama yapılmamıştır.

3.1.3 Kampüs Alt Yapısı

- “Kampüs Alt Yapısı” projesi kapsamında, 2020 yılı bütçesinden 2.100.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten 495.760.57 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı %23,60 dır.

- Temel drenajlarının zaman içinde tıkanıpı tespit edilmiş ve drenaj hattı yenilenmesinde 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 64.699,40-TL harcama yapılmıştır.

- Yollara trafik levha ve işaretçileri yerleştirilmiş ve Dumansız Kampüs hareketine katkıda bulunmak için sigara içilmeyen alanlar oluşturulmuştur. 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 24.898,09-TL harcama yapılmıştır.

- COVID-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dersliklerimizden biri Uzaktan Eğitim Stüdyosuna dönüştürülmüştür. 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 38.940,00-TL harcama yapılmıştır.

- Patili dostlarımız için bakım ve besleme alanı oluşturularak 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 56.050,00-TL harcama yapılmıştır.

- Üniversitemiz kampüsünde bulunan 109 adet Londra Çınarının bakımlarının yapılarak 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen proje ödeneğinden 67.900,06-TL harcama yapılmıştır.

- Üniversite merkezi kamera kayıt ve izleme sistem odası kurularak 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 106.200,00-TL harcama yapılmıştır.

-Kampüs genelinde işleyişin aksamaması için ivedi olarak yapılması gereken işler için tahsis edilen bütçe rakamlarından harcama yapılmıştır.

3.1.4 Muhtelif İşler

- Muhtelif İşler kapsamında, 2020 yılı bütçesinden 6.200.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten 6.118.916,90-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 98,70'dir.

-Büro mefruşatı alımları için,2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 2.886.392,06-TL harcama yapılmıştır.

-Büro Makinaları alımları için, 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 369.922,57-TL harcama yapılmıştır.

-Laboratuvar cihaz alımları Makine-Teçhizat için, 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 56.640,00-TL harcama yapılmıştır.

-İşyeri makine teçhizat alımları için, 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 797.947,70-TL harcama yapılmıştır.

-Diğer makine teçhizat alımları için, 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 1.315.135,53-TL harcama yapılmıştır.

-Bilgisayar alımları için, 2020 yılı bütçesinden tahsis edilen ödenekten 446.870,17-TL harcama yapılmıştır.

3.1.5 Yayın Alımı

- “Yayın Alımı” kapsamında, 2020 yılı bütçesinden 1.000.000.00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten 993.383.36 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 99,34 dur.

3.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma)

- “Merkezi Araştırma Kapsamı Laboratuvarı” 2020 yılı bütçesinden 10.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsil edilen ödenekten harcama yapılmamıştır.

3.2 Proje Tamamlanma Raporu

2020 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Proje Tamamlanma Raporu” başlıklı tablolarda verilmiştir.

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2020H03-151060			2020H03-151060		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim			Eğitim/Yükseköğretim		
Proje Amacı	Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımları ve Büyük Onarımlar					
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat,			Bakım onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat,		
Fiziki Hedefi	-					
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		6.200.000,00			6.200.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2020 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2020)</i>		6.118.916,90			6.118.916,90	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımı Yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projeye Üniversitemizin olağan faaliyetlerinin sağlanmasını, temel ve yardımcı hizmetlerin yerine getirilmesini temin mal alımı yapılarak ülke ve bölge eğitim-öğretimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Kurumumuzun eğitime destek amacıyla yapmış olduğu mal alımları bölge ticaretine hareket kazandırmış ve istihdama katkıda bulunmuştur.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Proje kapsamında Büro ve okul mefruşat alımları, asgari düzey üzerinde büro makinesi alımları, bilgisayar alımları, laboratuvar cihazı alımları, işyeri makine ve teçhizat alımları, kara taşıtı alımları ve üniversite hizmet binalarında büyük onarımlar yapılarak üniversitemizin eğitim-öğretim gibi temel hizmetlerini ve eğitime yardımcı hizmetler olan idari hizmetleri yerine getirmesi sağlanmıştır					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>	<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>
Proje No	2020H03-151047	2020H03-151047
Proje Adı	Yayın Alımı	Yayın Alımı

Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>			<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>		
Proje Amacı						
Proje Yeri	<i>İstanbul</i>			<i>İstanbul</i>		
Karakteristiği	<i>Basılı Yayın Alımı. Elektronik Yayın Alımı.</i>			<i>Basılı Yayın Alımı. Elektronik Yayın Alımı.</i>		
Fiziki Hedefi	-					
Başlama-Bitiş Tarihi	<i>2020-2020</i>			<i>2020-2020</i>		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		<i>1.000.000,00</i>			<i>1.000.000,00</i>	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2020 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2020)</i>		<i>993.383,36</i>			<i>993.383,36</i>	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	<i>406 adet yabancı dilde (Almanca - İngilizce) ,1.630 adet Türkçe olmak üzere toplam 2.036 adet Basılı Yayın Alımı, 8 Ulusal, 10 Uluslararası toplam 18 Elektronik yayın aboneliği/ alımı gerçekleştirilmiştir.</i>					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Gerçekleşen alımlar sayesinde kütüphane koleksiyonu 36.359 sayısına ulaşmıştır. Satın alınan veya abone olunan elektronik yayınlarla kütüphanenin 63 elektronik kaynakla hizmet vermesi sağlanmıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	<i>Projenin gerçekleşmesi sonucunda Üniversitenin, TR-Dizin- ISI Web of Science – Scopus ve PubMed Uluslararası İndekslerindeki toplam bilimsel yayın sayıları 332 olmuştur.</i>					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Yabancı dilde yayınlanmış kitap alımları ve Uluslararası Elektronik yayın aboneliği/ alımı gerçekleşirken gümrük ve yetki belgeleri erişiminde sorunlar yaşanmaktadır. Gümrük işlemleri için Üniversite Kütüphanelerinin "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" md. 100/ö hükümlerine tabi olup muafiyet kapsamına alınması sorunu büyük ölçüde çökmüştür. Elektronik yayınlarda gereken yetki belgesi temini için ANKOS ile yapılan çalışmalar sonucu çözmeye yardımcı olmaktadır.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	<i>Gelecekte sorunlar yaşanmaması için problemleri çözmeye odaklı, nitelikli personel eğitimleri yapılarak, taleplerin ve gelişmelerin hızlandırılması konusuna ağırlık verilecektir.</i>					

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)		
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>	<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>
Proje No	<i>2020H03-152744</i>	<i>2020H03-152744</i>
Proje Adı	<i>Kampüs Altyapısı</i>	<i>Kampüs Altyapısı</i>
Sektör/Altsektör	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>	<i>Eğitim/Yükseköğretim</i>
Proje Amacı		

Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Doğal Gaz Dönüşümü, Elkt Hattı, Kamp. İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İsale, Tel. Hattı			Doğal Gaz Dönüşümü, Elkt Hattı, Kamp. İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İsale, Tel. Hattı		
Fiziki Hedefi	-			-		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme Bedeli İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.100.000,00			2.100.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		495.760,57			495.760,57	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Üniversitemizin eğitim ve yaşam kalitesinin artması için talep edilen işler hayata geçirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	-					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kampüs hayatının kalitesinin artması için gerekli altyapı çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde yaşanan ve devam eden pandemi sebebiyle iş yaşamı rutininde aksamalar oluşmuş ve hedeflenen projelerden bazıları yapılamamıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
			<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>		<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>	
Proje No	2017K12-3941		2017K12-3941		2017K12-3941	
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı		Merkezi Araştırma Laboratuvarı		Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektör/Altsektör	Eğitim/Yükseköğretim		Eğitim/Yükseköğretim		Eğitim/Yükseköğretim	
Proje Amacı						
Proje Yeri	İstanbul		İstanbul		İstanbul	
Karakteristiği						
Fiziki Hedefi	-		-		-	
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2020		2017-2020		2017-2020	
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme Bedeli		İhale	
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2017		500.000,00			500.000,00	
2018		4.000.000,00			4.000.000,00	
2019		2.500.000,00			2.500.000,00	
2020		10.000,00			10.000,00	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
			<i>Cari Fiyatlarla</i>		<i>2020 Yılı Fiyatlarıyla</i>	
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		0			0	
2018		4.000.000,00			4.000.000,00	
2019		2.500.000,00			2.500.000,00	
2020		0			0	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<p><i>Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi yapılandırma çalışmaları yerleşke bazında tamamlanmış olup cihaz alımları devam etmektedir.</i></p>						

3.3 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

- Üniversitemizin bulunduğu bölgenin “doğal sit alanı” içerisinde olması sebebiyle yapılacak her türlü yatırım için birçok kurum ve kuruluştan onay alınmaktadır. Bu sebeple gerekli belgelerin tamamlanması ve inşaat faaliyetlerinin başlaması için planlanan iş sürelerinin, İstanbul’un diğer bölgelerine göre daha uzun olmasına neden olmakta ve hedeflenen bazı yatırımların aksamasına sebebiyet vermektedir.

- Üniversitemizin yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Personellerin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLO

Kurum Adı: Türk-Alman Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredisi	Özkaynak		Kredisi	Özkaynak		Kredisi	Özkaynak		Kredisi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6							38.700.000,00			6.900.000,00				45.600.000,00
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal								10.000,00							10.000,00
TOPLAM								38.710.000,00			6.900.000,00				45.610.000,00

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

